

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай
_____ Д.А. Култуева**

**СИЛЬНЫЙ
АЛТАЙ**

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 1 квартал 2022 года



7

Мероприятий
завершены в 2019 г.

7

Мероприятий
завершены в
2021 г.

14

мероприятий


2

мероприятий со
сроком
завершения в
2022 г.

12

Мероприятий
переходящего
характера на 2023 г.

**•Уровень
исполнительской
дисциплины по
контрольным точкам**

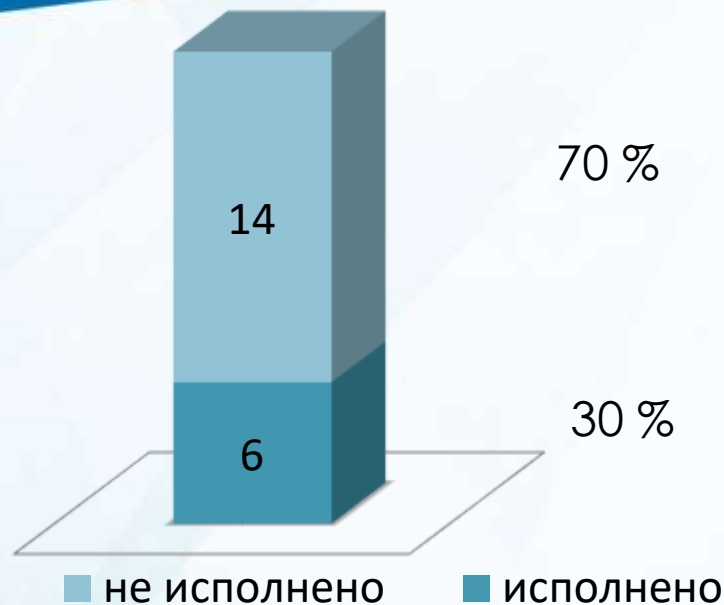

20

КОНТРОЛЬНЫХ
ТОЧЕК
В 2022 г.

Источники финансирования			
	План на 2022 год	факт на 01.04.2022	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников), тыс.руб.	49 552,71	0,0	0,0
федеральный бюджет	48 566,6	0,0	0,0
республиканский бюджет	490,6	0,0	0,0
местные бюджеты	495,5	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	—



П.п.	Наименование мероприятия	Наименование контрольных точек	Статус
1.175	Капитальный ремонт СДК, Усть-Канский район, с. Черный Ануй	КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
		КТ 2: Заключен контракт на капитальный ремонт СДК	Исполнено
		КТ 3: Завершен капитальный ремонт СДК	Не исполнено, в работе
1.240	Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Сугаш	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
		КТ 2: Заключен контракт на строительство	Не исполнено, в работе
		КТ 3: Завершены строительно-монтажные работы	Не исполнено, в работе
1.216	Строительство СДК, Улаганский район, с. Чибиля	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
1.289	Капитальный ремонт СДК, Чойский район, с. Каракокша	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
1.298	Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Чибит	КТ 1: Разработка ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы	Исполнено
		КТ 2: Заключен контракт на строительство	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
		КТ 3: Завершены строительно-монтажные работы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.300	Строительство СДК, Улаганский район, с. Улаган	КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, ПСД не разработана ⁴



П.п.	Наименование мероприятия	Наименование контрольных точек	Статус
1.217	Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Усть-Сема	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.239	Строительство СДК, Шебалинский район, с. Беш-Озек	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.281	Капитальный ремонт СДК, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.284	Капитальный ремонт дома творчества и досуга, Турочакский район, с. Турочак	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.286	Капитальный ремонт СДК, Турочакский район, с. Тондошка	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2025-2026 гг.
1.292	Капитальный ремонт СДК, Майминский район, с. Алферово	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.294	Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Аюла	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.299	Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Коо	КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.

ПУНКТ 1.228 СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В 2022 г. предусмотрено 10 млн.руб. из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в с. Онгудай. Проводятся демонтажные работы.




ПУНКТ 1.240 СТРОИТЕЛЬСТВО СДК С. СУГАШ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

Предусмотрено 34,22 млн. руб. на строительство (из них 33,5 млн.руб. из федерального бюджета).

Заключен контракт 29.04.2022 г. с ООО «Химакрил». Ввод в эксплуатацию в 2023 г.



ПУНКТ 1.175 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК В С. ЧЕРНЫЙ-АНУЙ, УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА

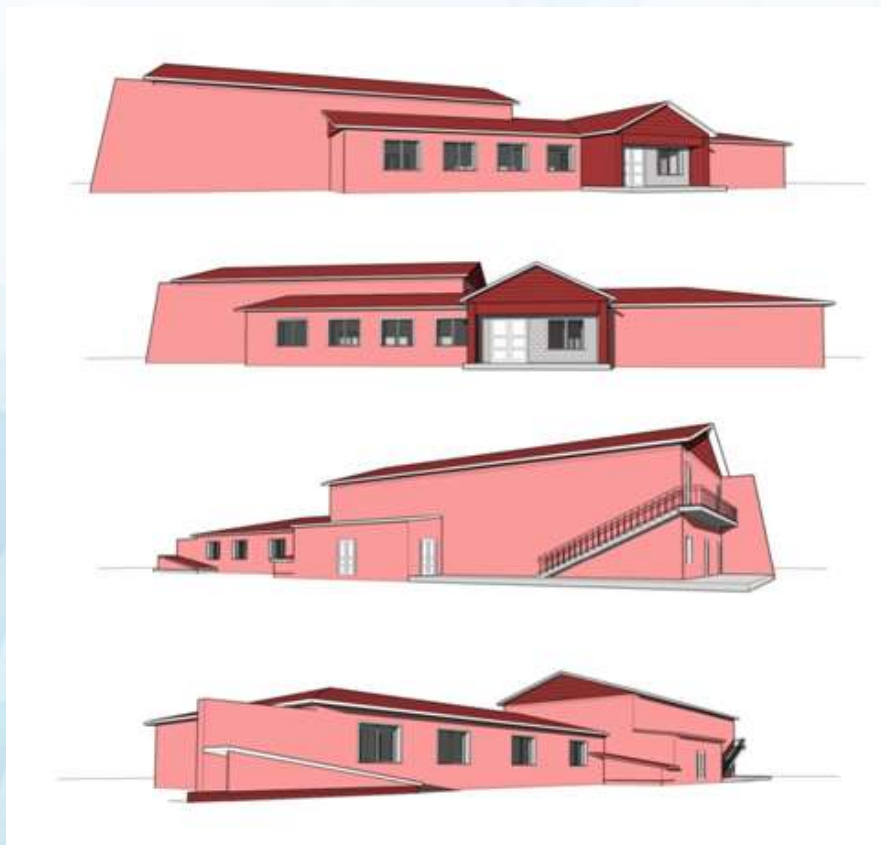

**На 2022 г. предусмотрено
17,25 млн.руб. (из них 16,9
из ФБ)**

**Контракт заключен с ООО
«Бизон» на сумму 16,62
млн.руб.**

**Проводятся демонтажные
работы и ремонт крыши.**

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

**с.Чоя,
Чойский р-н**

- Заключен контракт с ООО «Сим-Строй» на сумму 2,57 млн.руб. Сроки выполнения работ до 10 августа 2022 г.

**с.Паспаул,
Чойский р-н**

- Заключен контракт с ООО»Сим-Строй» на сумму 2,35 млн.руб. Сроки выполнения работ до 10 августа 2022 г.

**с.Акташ,
Улаганский р-н**

- Заключен контракт с ООО «МИР» на сумму 4,53 млн.руб. Сроки выполнения работ до 15 июля 2022 г.

**с. Турочак,
Турочакский р-н**

- Заключен контракт с ООО «АлтайСтройкомплект» на сумму 3,78 млн.руб. Сроки выполнения работ до 1 августа 2022 г.

**с. Чендек,
Усть-Коксинский р-н**

- Заключен контракт с ИП А.В. Мендешевым на сумму 4,77 млн.руб. Сроки выполнения работ до 15 ноября 2022 г.

ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ШЕБАЛИНСКОЙ ДШИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

В 2022 г. предусмотрено 5,5 млн.руб. на приобретение струнных, клавишных инструментов, учебной литературы и оргтехники. Осуществлена поставка пианино, гитар, ноутбука и МФУ.



Целевые показатели эффективности программы «Сильный Алтай»:

Наименование целевого показателя	Плановое значение на текущий год, %	Фактическое значение по итогам 1 кв. 2022 г.	Процент достижения:
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	74,3	60,3	81,2%
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания)	87,3	91,6	104,9%
