


СОГЛАСОВАНО:

**Первый Заместитель
Председателя
Правительства Республики Алтай**

Э.А. Ямбаев
Э.А. Ямбаев

**СИЛЬНЫЙ
АЛТАЙ**

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 3 квартал 2022 года



55%
переходящие
КТ

14
мероприятий
20
контрольных точек

35%
исполнено

10%
не исполнено

2
мероприятий со
сроком
завершения в
2022 г.


12
Мероприятий
переходящего
характера на 2023 г.

**Уровень
исполнительской
дисциплины по
контрольным точкам**



20
контрольных
точек
в 2022 г.

| Источники финансирования | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | План на 2022 год | План по утвержденной редакции | факт на 01.10.2022 | кассовое исполнение, % |
| ВСЕГО (за счет всех источников), тыс.руб. | 52 352,9 | 49 522,7 | 26 318,31 | 50,3 |
| федеральный бюджет | 50 448,6 | 48 566,60 | 25 712,25 | 50,9 |
| республиканский бюджет | 509,58 | 490,59 | 259,72 | 50,9 |
| местные бюджеты | 1 394,72 | 495,52 | 322,35 | 23,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



| П.п. | Наименование мероприятия | Наименование контрольных точек | Статус |
|-------|--|--|---|
| 1.175 | Капитальный ремонт СДК, Усть-Канский район, с. Черный Ануй | КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Исполнено |
| | | КТ 2: Заключен контракт на капитальный ремонт СДК | Исполнено |
| | | КТ 3: Завершен капитальный ремонт СДК | Не исполнено, в работе |
| 1.240 | Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Сугаш | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Исполнено |
| | | КТ 2: Заключен контракт на строительство | Исполнено |
| | | КТ 3: Завершены строительные-монтажные работы | Не исполнено, в работе |
| 1.216 | Строительство СДК, Улаганский район, с. Чибиля | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Исполнено |
| 1.289 | Капитальный ремонт СДК, Чойский район, с. Каракокша | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Исполнено |
| 1.298 | Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Чибит | КТ 1: Разработка ПСД и получение положительного заключения госэкспертизы | Исполнено |
| | | КТ 2: Заключен контракт на строительство | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| | | КТ 3: Завершены строительные-монтажные работы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.300 | Строительство СДК, Улаганский район, с. Улаган | КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, ПСД не ⁴ разработана |




| П.п. | Наименование мероприятия | Наименование контрольных точек | Статус |
|-------|--|--|---|
| 1.217 | Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Усть-Сема | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.239 | Строительство СДК, Шебалинский район, с. Беш-Озек | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.281 | Капитальный ремонт СДК, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.284 | Капитальный ремонт дома творчества и досуга, Турочакский район, с. Турочак | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.286 | Капитальный ремонт СДК, Турочакский район, с. Тондошка | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2025-2026 гг. |
| 1.292 | Капитальный ремонт СДК, Майминский район, с. Алферово | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.294 | Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Аюла | КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |
| 1.299 | Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Коо | КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы | Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг. |




ПУНКТ 1.228 СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК


В 2022 г. предусмотрено 10 млн.руб. из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в с. Онгудай. Выполнен капитальный ремонт здания, поставлены мебель и оргтехника, пополнен книжный фонд.

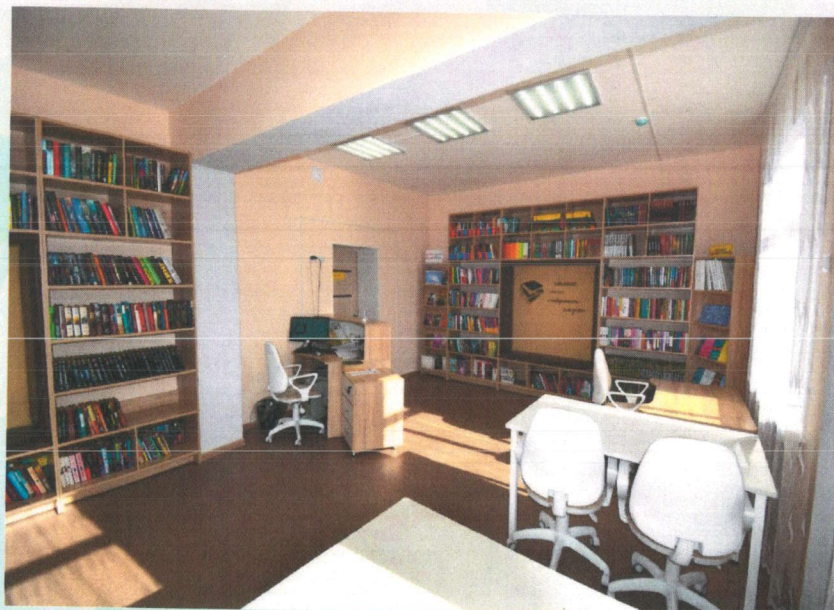



ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

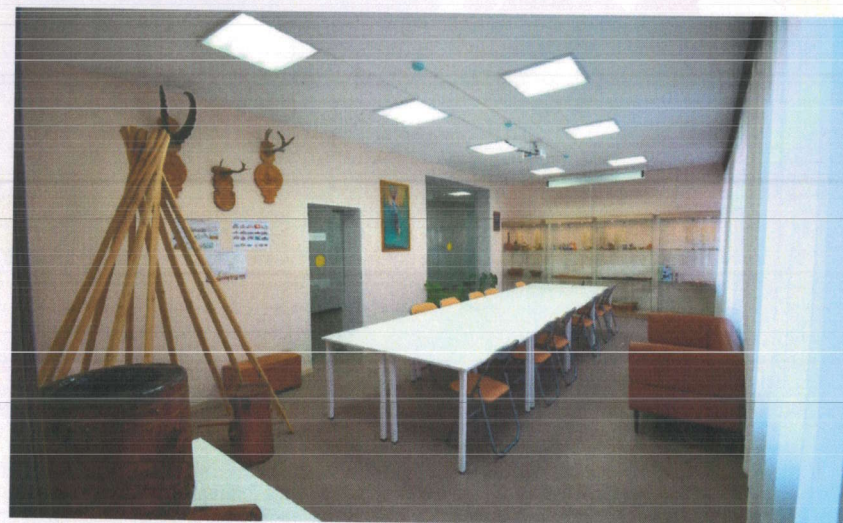




ПУНКТ 1.240 СТРОИТЕЛЬСТВО СДК С. СУГАШ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА


Предусмотрено 34,22 млн. руб. на строительство (из них 33,5 млн.руб. из федерального бюджета). Заключен контракт 29.04.2022 г. с ООО «Химакрил». Ввод в эксплуатацию в 2023 г. Выполнен демонтаж старого фундамента, установлено ограждение строительной площадки, пробурена скважина, установлен насос для подпитки котла, залито дно котлована.






В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

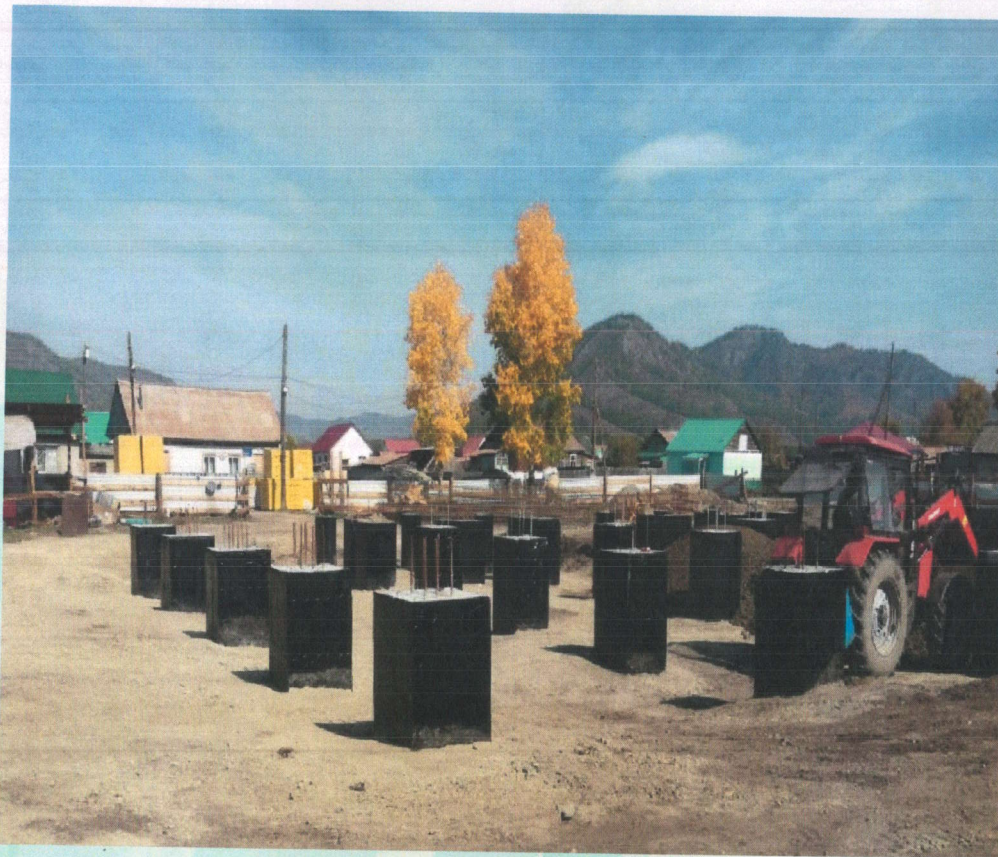

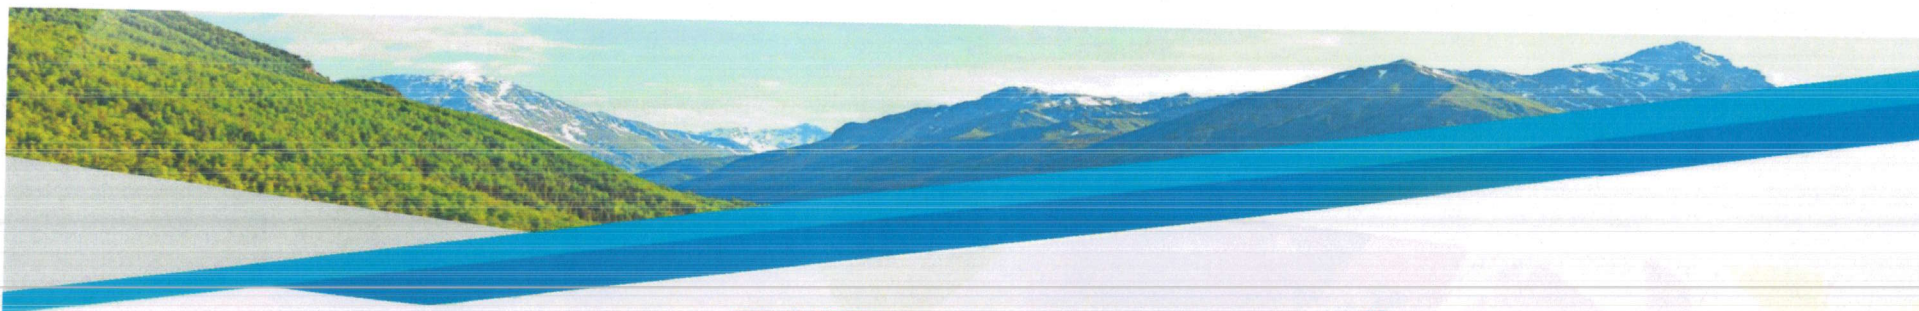

ПУНКТ 1.175 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК В С. ЧЕРНЫЙ-АНУЙ, УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА



**На 2022 г. предусмотрено 17,25
млн.руб. (из них 16,9 из ФБ)**


**Контракт заключен с ООО «Бизон»
на сумму 16,91 млн.руб.**

**Демонтаж, ремонт крыши, ремонт
стен и полов завершены;
установлены
перегородки, вентиляция, силовая
электрика.**

**Проведена оплата на сумму 9,12
млн.руб. за выполненные работы.**



В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА

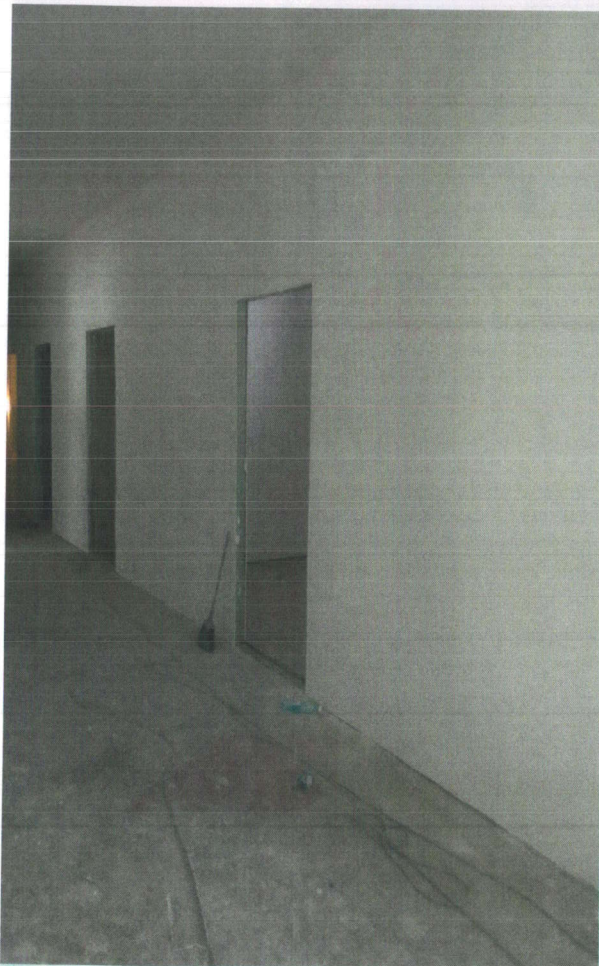



МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

**с.Чоя,
Чойский р-н**

- Заключен контракт с ООО «Сим-Строй» на сумму 2,57 млн.руб. Работы выполнены в срок в полном объеме.

**с.Паспаул,
Чойский р-н**

- Заключен контракт с ООО «Сим-Строй» на сумму 2,35 млн.руб. Работы выполнены в срок в полном объеме.

**с.Акташ,
Улаганский р-н**


- Заключен контракт с ООО «МИР» на сумму 4,53 млн.руб. Работы выполнены в срок в полном объеме.

**с. Турочак,
Турочакский р-н**


- Заключен контракт с ООО «АлтайСтройкомплект» на сумму 3,78 млн.руб. Работы выполнены в срок в полном объеме.

**с. Чендек,
Усть-Коксинский р-н**

- Заключен контракт с ИП А.В. Мендешевым на сумму 4,77 млн.руб. Сроки выполнения работ до 15 ноября 2022 г.

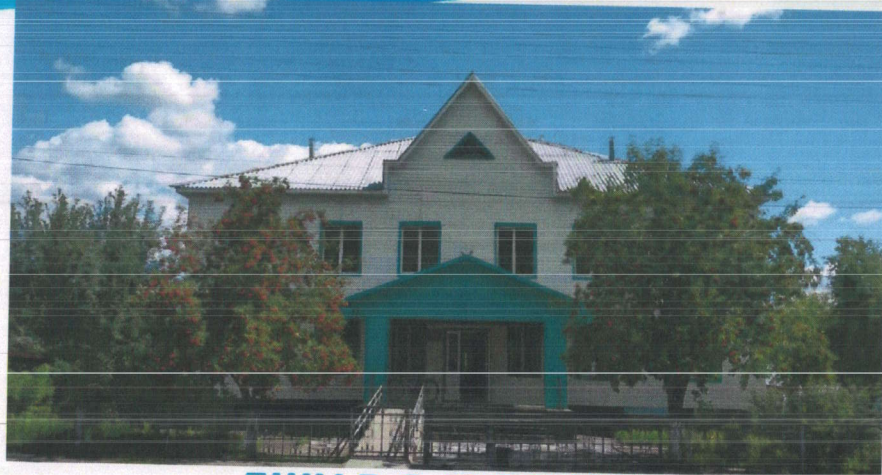

ДШИ В С. ТУРОЧАК

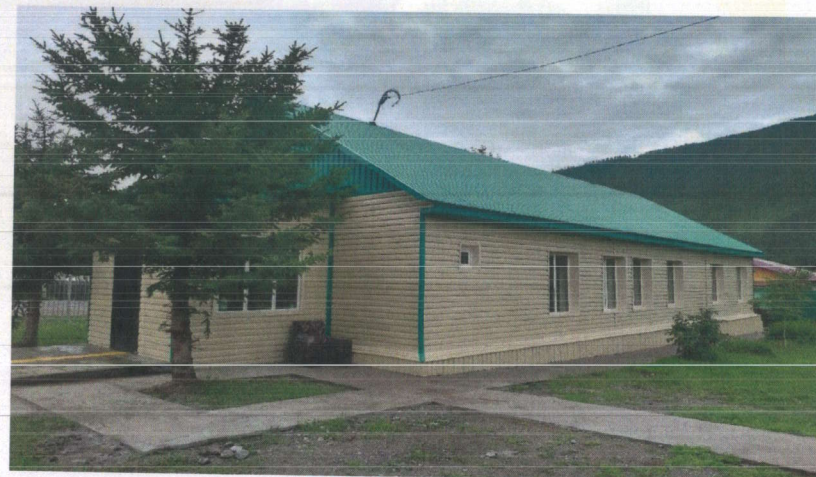

ДМШ В С. АКТАШ



ДШИ В С. ЧОЯ




ДШИ В С. ПАСПАУЛ



ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ШЕБАЛИНСКОЙ ДШИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

В 2022 г. предусмотрено 5,5 млн.руб. на приобретение струнных, клавишных инструментов, учебной литературы и оргтехники.

Осуществлена поставка пианино, гитар, ноутбука, домра, балалаек, МФУ, звуковое и световое оборудования





Целевые показатели эффективности программы «Сильный Алтай»:

| Наименование целевого показателя | Плановое значение на текущий год, % | Фактическое значение по итогам 3 кв. 2022 г. | Процент достижения: |
|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 25,7 | 39,7 | 81,2% |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) | 87,3 | 91,6 | 104,9% |

О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай»

Планом мероприятий в отчетном периоде предусмотрена реализация 14 мероприятий, содержащих 20 контрольных точек. Из них: 20 контрольных точек предусмотрены в 2022 г. Исполнены 7 контрольных точек, не исполнены - 13 (из них 11 переходящего характера, 2 - в работе).

Пункт 1.228 «Материально-техническое оснащение сельских библиотек». По итогам 3 квартала 2022 в рамках реализации национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» в рамках мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек в 2022 году открыта модельная библиотека в с. Онгудай Онгудайского района. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации, поставлено 2807 книг (100%). Работы по текущему ремонту выполнены, товары и услуги предоставлены в полном объеме. Кассовое исполнение - 100%.

Пункт 1.175 «Капитальный ремонт СДК, Усть-Канский район, с. Черный Ануй».

В текущем году проводится капитальный ремонт сельского дома культуры с. Черный-Ануй, Усть-Канского района. Объем финансирования в текущем году составляет 17 251,3 тыс.руб., в том числе из ФБ - 16 908,6 тыс.руб., РБ - 170,8 тыс.руб., МБ - 172,5 тыс.руб. Контракт заключен 01.04.2022 г. с ООО «Бизон» на 16 908,66 тыс. руб.

Завершены демонтаж, ремонт крыши, ремонт стен и полов. Установлены перегородки, вентиляция и силовая электрика.

Проведена оплата на сумму 9,02 млн.руб. за выполненные работы., 100 тыс. руб. за услуги по строительному контролю. Проводится подключение электричества, укладка пола плитам. Техническая готовность - 82%. Кассовое исполнение - 53%.

Пункт 1.240 «Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Сугаш».

В 2022 году на строительство сельского дома культуры в с. Сугаш, Усть-Коксинского района предусмотрено 35,1 млн.руб., в том числе из ФБ - 33,5 млн.руб., РБ - 338,8 тыс.руб., МБ - 1 222,21 тыс.руб.

Техническая готовность - 14%. Установлено ограждение строительной площадки, залито дно котлована, выполнено армирование

стаканов, монтаж каркасов колонн. Ввод в эксплуатацию в декабре 2023 г.

Пункты 1.216 «Строительство сельского клуба в с. Чибиля, Улаганского района» и 1.289 «Капитальный ремонт СДК, Чойский район, с. Караккокша»

Данные мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Министерство подало заявки на конкурс на финансирование в 2023 г.

Пункты 1.294 «Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Аюла» и 1.292 «Капитальный ремонт СДК, Майминский район, с. Алферово»

Реализация по данным мероприятиям на стадии разработки ПСД.

Пункт 1.300 «Строительство СДК, Улаганский район, с. Улаган»

Пункт 1.286 «Капитальный ремонт СДК, Турочакский район, с. Тондошка»

Исполнение мероприятий по строительству сельского дома культуры в с. Улаган и капитальному ремонту СДК в с.Тондошка перенесены на более поздний период, в связи с отсутствием проектно-сметной документации.
