

**Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы
«Сильный Алтай»
за 2020 год
Министерство культуры Республики Алтай**



2

мероприятия
завершены в
2019 г.

0

мероприятий
завершены в
2020 г.

17

мероприятий

6


мероприятий,
переходящих
с 2020 г.

9


мероприятий
со сроком начала
реализации с 2021
г.

контрольных
точек
в 2020 г.

**Приоритет
развития?**

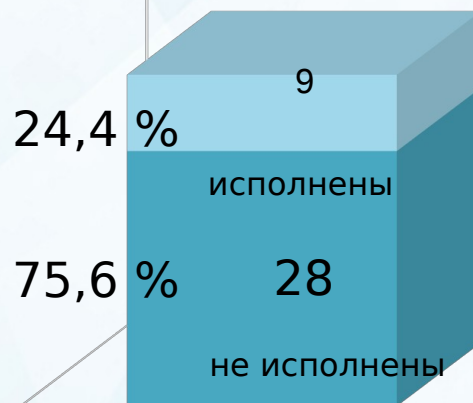

КТ со сроком исполнения
в 2020 г.




КТ
переходящие с 2020 г.

Источники финансирования	2020 год		
	план	факт	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников)	37 214,3	37 214,3	100
федеральный бюджет	36 473,7	36 473,7	100
республиканский бюджет	368,4	368,4	100
местные бюджеты	372,1	372,1	100
внебюджетные	0,0	0,0	0


Контрольные точки с риском неисполнения

28


контрольных
точек



2 КТ – 31.12.2020 г. Мероприятие «Капитальный ремонт Дома творчества и досуга, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса (п.1.167) не выполнено в 2020 году, так как по результатам конкурсного отбора, объект не вошел в число победителей, в связи с чем срок планового исполнения будет перенесен на 2022 год.



3 КТ – 31.12.2020 г. Мероприятие «Создание Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай» г. Горно-Алтайск» (п. 1.186) не выполнен в 2020 году, в связи с отсутствием средств на разработку проектно-сметной документации, срок исполнения будет перенесен на 2021 год.



3 КТ – 31.08.2020 г. Мероприятие «Организация в Улаганской ДШИ кружков по программам «Горловое пение» и «Национальные инструменты» (п. 1.223) не выполнено в 2020 году, так как вопросы по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры отнесены к вопросам местного значения.



12 КТ – 31.12.2020 г. 4 Мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры в с. Тобелер Кош-Агачского района, в с. Катанда Усть-Коксинского района, с. Теректа Усть-Коксинского района, с. Хабаровка Онгудайского района (п.1.231-п.1.234) не выполнены в 2020 году, так как по результатам конкурсного отбора, объекты не вошли в число победителей, в связи с чем срок планового исполнения будет перенесен на 2022 год и последующие года.



8 КТ – 31.07.2020 г. 2 Мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры в с. Горбуново и в с. Карагай Усть-Коксинского района (п.1.241, п. 1.249), не выполнены в 2020 году, так как по данным объектам необходимо наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы.

«Концепция создания Центра Алтайской цивилизации «Алтай-Кабай»

Заключен договор с Горно-Алтайским государственным университетом на разработку концепции по созданию Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай», для подготовки проектно-сметной документации и дальнейшего участия в федеральной адресной инвестиционной программе.

Центр алтайской цивилизации «Алтай-Кабай»



Горно-Алтайск
2020



Строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир
Кош-Агачского района:

Объем финансирования на 2020 год, составил 37 214,3 тыс.руб.


Кассовое исполнение за 4 квартал составило 100 %.




Сметная стоимость объекта
- 80,8 млн. рублей





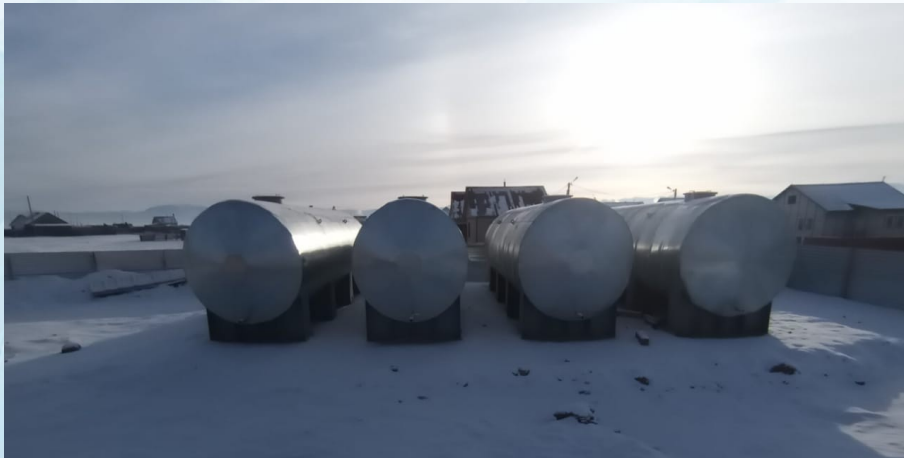



Строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры позволит:

- достичь целевой показатель национального проекта «Культура» «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»,
- Создать новые рабочие места,
- Расширить спектр предоставляемых населению услуг,
- Сохранить культурные ценности на селе.
