

СОГЛАСОВАНО:

**Первый Заместитель
Председателя
Правительства Республики Алтай
_____ Э.А. Ямбаков**

**СИЛЬНЫЙ
АЛТАЙ**

Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» по итогам 2022 года






2
мероприятия со
сроком
завершения в
2022 г.

12
мероприятий
переходящего
характера на 2023 г.

**Уровень
исполнительской
дисциплины по
контрольным точкам**

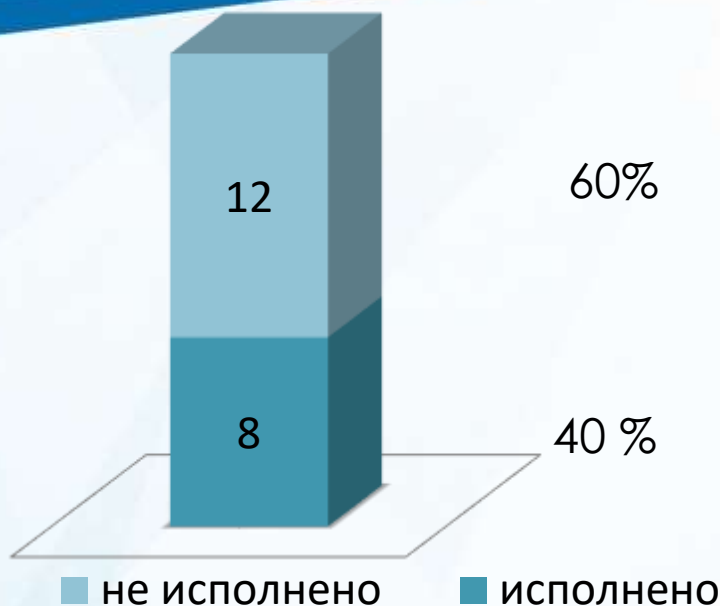

20

КОНТРОЛЬНЫХ
ТОЧЕК
в 2022 г.

Источники финансирования				
	План на 2022 год	План по утвержденной редакции	факт на 01.01.2023	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников), тыс.руб.	56 955,8	49 522,7	56 955,8	100
федеральный бюджет	50 448,6	48 566,60	50 448,6	100
республиканский бюджет	509,58	490,59	509,58	100
местные бюджеты	997,66	495,52	997,66	100
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0 3



П.п.	Наименование мероприятия	Наименование контрольных точек	Статус
1.175	Капитальный ремонт СДК, Усть-Канский район, с. Черный Ануй	КТ 2: Заключен контракт на капитальный ремонт СДК	Исполнено
		КТ 3: Завершен капитальный ремонт СДК	Не исполнено, в работе
1.240	Строительство СДК, Усть-Коксинский район, с. Сугаш	КТ 2: Заключен контракт на строительство	Исполнено
		КТ 3: Завершены строительные-монтажные работы	Не исполнено, в работе
1.186	Создание Центра алтайской цивилизации «Алтай-Кабай»	КТ 4: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено
1.216	Строительство СДК, Улаганский район, с. Чибиля	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
1.289	Капитальный ремонт СДК, Чойский район, с. Каракокша	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Исполнено
1.298	Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Чибит	КТ 2: Заключен контракт на строительство	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
		КТ 3: Завершены строительные-монтажные работы	Не исполнено, планируется в 2023-2024 гг.
1.300	Строительство СДК, Улаганский район, с. Улаган	КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, ПСД не Разработана ⁴



П.п.	Наименование мероприятия	Наименование контрольных точек	Статус
1.217	Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Усть-Сема	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.239	Строительство СДК, Шебалинский район, с. Беш-Озек	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.281	Капитальный ремонт СДК, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.284	Капитальный ремонт дома творчества и досуга, Турочакский район, с. Турочак	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.286	Капитальный ремонт СДК, Турочакский район, с. Тондошка	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2025-2026 гг.
1.292	Капитальный ремонт СДК, Майминский район, с. Алферово	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.294	Капитальный ремонт СДК, Чемальский район, с. Аюла	КТ 1: Разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025 гг.
1.299	Капитальный ремонт СДК, Улаганский район, с. Коо	КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы	Не исполнено, планируется в 2024-2025гг.

ПУНКТ 1.228 СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В 2022 г. предусмотрено 10 млн.руб. из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в с. Онгудай. Выполнен капитальный ремонт здания, поставлены мебель и оргтехника, пополнен книжный фонд.





ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ



ПУНКТ 1.240 СТРОИТЕЛЬСТВО СДК С. СУГАШ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

Предусмотрено 34,22 млн. руб. на строительство (из них 33,5 млн.руб. из федерального бюджета). Заключен контракт 29.04.2022 г. с ООО «Химакрил». Ввод в эксплуатацию в 2023 г. Выполнен демонтаж старого фундамента, установлено ограждение строительной площадки, пробурена скважина, установлен насос для подпитки котла, залито дно котлована.





В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА




ПУНКТ 1.175 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК В С. ЧЕРНЫЙ-АНУЙ, УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА



На 2022 г. проведение капитального ремонта здания. предусмотрено 17,25 млн.руб.

Выполнен ремонт крыши, обшивка и утепление здания, ремонт потолков, полового покрытия. Полностью заменены инженерные сети здания.

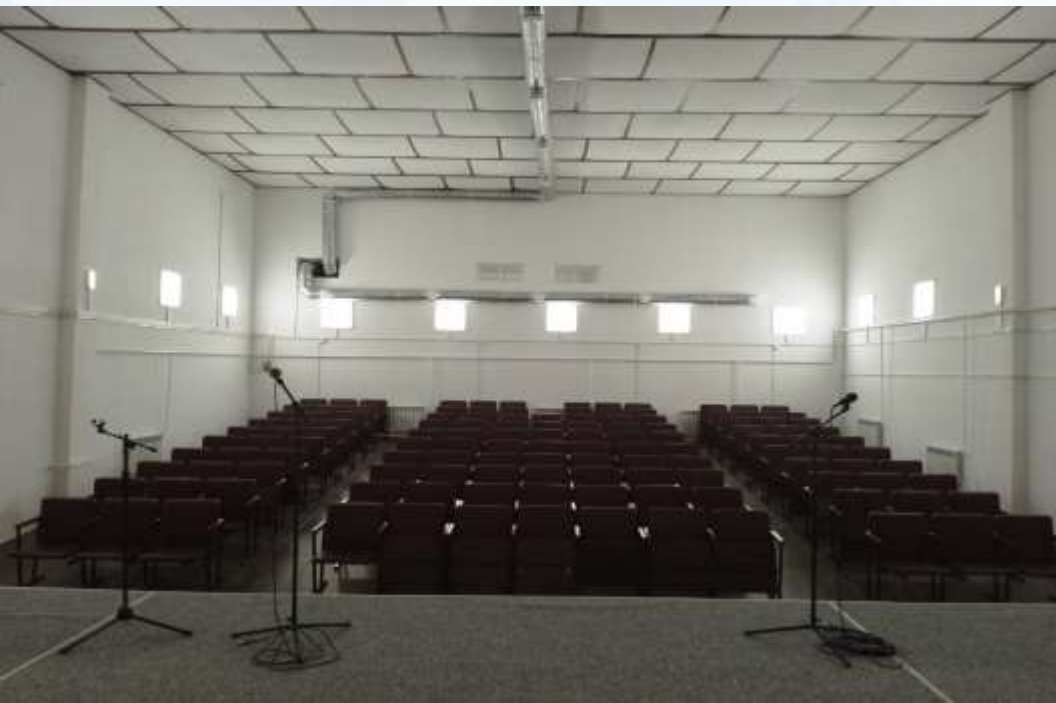

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В С. АКТАШ

**Выполнен ремонт крыши, обшивка и утепление здания.
Отремонтированы инженерные сети здания, установлено
металлическое ограждение.**



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В С. ПАСПАУЛ

Выполнены установка новых окон и дверей, монтаж дровника, ремонт полов, работы по внутренней отделке и ремонт электроосвещения.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В С. ЧОЯ

Выполнены установка новых окон и дверей, ремонт крыши, установка тамбура, работы по внутренней отделке, ремонт водосточной системы и отопления.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В С. ЧЕНДЕК

Выполнены: установка новых окон и дверей, ремонт крыши, укрепление стен, работы по внутренней отделке, ремонт полов, ремонт инженерной сети здания, обшивка и утепление здания.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В С. ТУРОЧАК

Выполнены ремонт крыши и фасада здания, ремонт систем водоснабжения, канализации и электроснабжения.



ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ШЕБАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ



На 5,5 млн. руб. приобретены рояль, пианино, баяны, аккордеоны, гитары, балалайки, интерактивная доска, свето-звуковое оборудование, а также оргтехника и учебные материалы.



Целевые показатели эффективности программы «Сильный Алтай»:

Наименование целевого показателя	Плановое значение на текущий год, %	Фактическое значение по итогам 2022 г.	Процент достижения:
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, (%)	74,3	54,1	72,8%
Число посещений культурных мероприятий, (Тыс.ед.)	2581,53	3012,58	116,7%
