

СОГЛАСОВАНО:

**Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай
_____ Э.А. Ямбаков**



ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА





25%
в работе

12%
исполнено



12
мероприятий

16
контрольных точек


62%
не исполнено

2
мероприятия со сроком
завершения в 2023 году

10
мероприятий
переходящего характера
на 2024 год



УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ

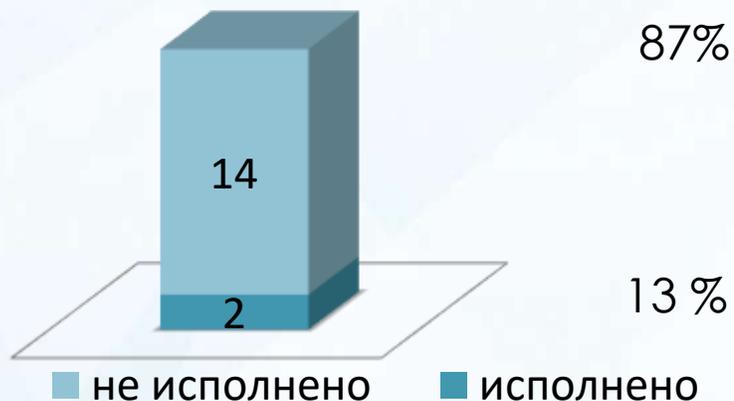

16
контрольных точек
в 2023 году

Источники финансирования				
	План на 2023 год	План по утвержденной редакции	факт на 01.04.2023	кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников), тыс.руб.	47 136,6	47 500,0	0,0	0
федеральный бюджет	20 000,0	47 251,2	0,0	0
республиканский бюджет	26 000,0	123,8	0,0	0
местные бюджеты	1 136,6	125,0	0,0	0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

ПУНКТ 1.1167 СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В 2023 году по модельному стандарту будут модернизированы Центральная библиотека г. Горно-Алтайска и Турочакская библиотека им.М.В. Башунова





**Проведен текущий ремонт здания
Турочакской библиотеки**


**Заклучены контракты на поставку
книг, мебели и оборудования**



ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В С. ТУРОЧАК

**В Центральной библиотеке г.Горно-Алтайска проводятся работы по капитальному и текущему ремонту;
Заключены контракты на поставку книг, интерактивного оборудования и мебели.**



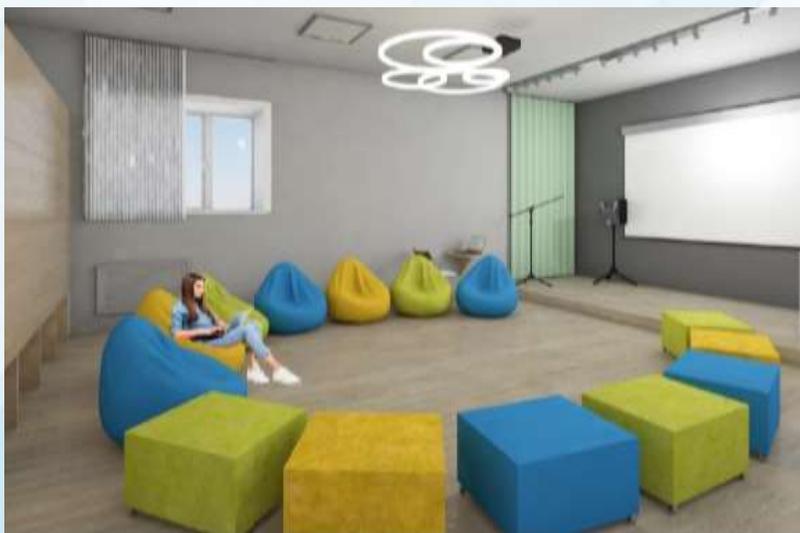

ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г. ГОРНО-АЛТАЙСК

ПУНКТ 1.240 СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ С. СУГАШ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА

Предусмотрено 61,4 млн. руб. на строительство (из них 33,5 млн.руб. из федерального бюджета, 26,4 из республиканского бюджета)

Заключен контракт 29.04.2022 г. с ООО «Химакрил». Ввод в эксплуатацию в 2023 году.

Залито дно котлована, установлены опалубки и выполнено армирование стаканов, выполнен монтаж каркасов колонн. Выполняется кладка внутренних перегородок и стен.





В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



1.175 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК, УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН, С. КОЗУЛЬ»

Проектно-сметная документация разработана, имеется заключение государственной экспертизы.

В 2023 году была направлена заявка в Министерство культуры РФ для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии в 2024 году.



1.239. СТРОИТЕЛЬСТВО СДК УЛАГАНСКИЙ РАЙОН, С. АКТАШ

Согласно дорожной карте строительство объекта планировалось в 2025 году.

В 2023 г. будет начато строительство сельского дома культуры в с. Акташ.

На реализацию данного мероприятия в текущем году предусмотрено 60,6 млн. руб. Контракт планировалось заключить 3 мая, однако результаты определения подрядчика были отменены по предписанию УФАС РА.

Повторный аукцион объявлен 11.05.2023 г. Контракт будет заключен до 16.06.2023 г.



ПУНКТ 1.234 СТРОИТЕЛЬСТВО СДК С.ОГНЕВКА УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА



По данному объекту имеется проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы.

В 2024 году будет направлена заявка на предоставление субсидии.

1.231 «СТРОИТЕЛЬСТВО СДК, ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН, С. БЕШ-ОЗЕК»

1.270 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК, ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН, С. МАЛЫЙ-ЯЛОМАН»

1.275 «СТРОИТЕЛЬСТВО СДК, ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН, С. ОЗЕРО-КУРЕЕВО»

1.280 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК, ЧОЙСКИЙ РАЙОН, С. ПАСПАУЛ»

1.238 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК, МАЙМИНСКИЙ РАЙОН, С. АЛФЕРОВО»

1.286 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК, ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ЕЛАНДА»

При наличии разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы, данные объекты включены в заявку на строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры в Министерство культуры РФ. На данный момент отсутствуют средства в муниципальных образованиях на разработку ПСД

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»:

Наименование целевого показателя	Плановое значение на текущий год, %	Фактическое значение по итогам 1 кв. 2023 г.	Процент достижения:
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, (%)	72,8	54,1	72,8%
Число посещений культурных мероприятий, (тыс.ед.)	2 813,53	748,2	26,6%

The background features a scenic landscape with green forested hills in the foreground and snow-capped mountains in the distance under a clear sky. A thick, blue, 3D-style wave graphic runs horizontally across the top of the slide, separating the landscape from the main content area. The main content area has a light blue background with a subtle geometric pattern of overlapping triangles.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
